




ජාතික විගණන කාර්යාලය

ජාතික විගණන කාර්යාලය
National Audit Office



විගණන විමසීම - AUDIT QUERY

විමසීම අංකය }
විගණන මණ්ඩලය }
Query No } SCLG/KG/A/APS/2024/AQ/16(1)

නිකුත් කරන දිනය }
මුද්‍රණය වූ දිනය }
Date of Issue } 2025 මාර්තු 14 දින

Addressed to }
විෂය }
Subject }
ලේකම් හා මධ්‍යම, කාර්ය කාර්යාලය, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරී, පළාත් මට්ටම, විරකාපොල, ප්‍රාදේශීය සභාව, වරකාපොල, සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව - 2024 වර්ෂය

ලේකම්, විගණන කාර්යාලය
[Signature]

මෙම පැහැදිලි කිරීම සඳහා තොරතුරු සැපයීමේ/විමසීමේ වග අතර විගණන වාර්තාවක් නොවේ.
This is only a query calling for information for clarification and not an audit report.
இவ்விரிவுரை தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்ளவும், பகுப்பாய்வதற்காகவுமே அன்றி இது ஒரு கணக்காய்வு அறிக்கை அல்ல.

මම විසින් නිරතුරුවම විගණනය වෙනුවෙන් දක්වනු ලබන දායකත්වය අගය කරන අතර, වරකාපොල ප්‍රාදේශීය සභාවේ 2024 වර්ෂයට අදාළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය වූ පහත සඳහන් කරුණු සනාථ කර ගැනීම සඳහා ඔබගේ කාරුණික දායකත්වය අපේක්ෂා කරමි.

02. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව

(අ) ප්‍රාදේශීය සභා අරමුදල් ව්‍යාපෘති

ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් 2024 වර්ෂය අදාළව උපලේඛන 01 හි සඳහන් පරිදි රු.147,770,000 ක්වූ ව්‍යාපෘති (කර්මාන්ත) 23 ක් සහ අරමුදලින් ඉටුකිරීම සඳහා ඉලක්ක කර තිබුණද වර්ෂය අවසන් වන තුරුත් එකී ව්‍යාපෘති ඉටුකර නොතිබුණි.

(ආ) සභා අරමුදල් නොවන අනිකුත් ව්‍යාපෘති

ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් වෙනත් ආයතන වලින් අරමුදල් සපයන ව්‍යාපෘති 339 ක් ඉටුකිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන සලසාගෙන තිබුණි. විස්තර පහත දැක්වේ.



සමූහාධිකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය

වැඩසටහන	වැඩ යෝජනා සංඛ්‍යාව	වැඩ අවසන් (ක්‍රියාත්මක කරන ලද) ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	වැඩ අවසන් කර නොමැති ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
කඳුකර දශකය	100	94	06
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන	04	02	02
සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය	02	02	-
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය	68	59	09
දිස්ත්‍රික් විශේෂ සංවර්ධන වැඩසටහන	21	20	01
ග්‍රාමීය මාර්ග කර්මාන්ත	71	65	06
විමධ්‍යගත කර්මාන්ත	73	70	03
එකතුව	<u>339</u>	<u>312</u>	<u>27</u>

මේ අනුව සමස්ත යෝජනා 339 න් 25 ක්ම 2024 දෙසැම්බර් 31 වන විට වැඩ අවසන් කර නොතිබුණු අතර ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍රතිපාදන ලද කර්මාන්ත 02 ක ගිවිසුම් අත්සන් කර ද නොතිබුණි.

(ඇ) ඉටුකරන ලද කර්මාන්ත 10 කට අදාළ ලිපිගොනු නියදියක් පරීක්ෂා කරන ලද අතර, එහිදී නිරීක්ෂණය වූ කරුණු පහත දැක්වේ.

- i. ව්‍යාපෘති ඇස්තමේන්තු කිරීමේදී නිසි ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදුකර ඇස්තමේන්තු සැකසිය යුතු වුවද, එසේ කටයුතු කළ බවට ලිපිගොනුවෙහි සාක්ෂි නොතිබුණු අතර මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල අවශ්‍ය ස්ථාන අතහැර එක් එක් පුද්ගල අවශ්‍යතා මත ව්‍යාපෘති තෝරාගැනීම හා ඇස්තමේන්තු කිරීම සිදුකර තිබුණි. මේ අනුව ව්‍යාපෘති තෝරා ගැනීමේදී එක් එක් මන්ත්‍රීවරයාට වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන පදනම් කරගෙන ව්‍යාපෘති තීරණය කිරීම නිසා මාර්ගයේ හෝ ගොඩනැගිලි වල අවශ්‍යතාවය ඉටු වී නොතිබුණි. උදාහරණ වශයෙන් අවස්ථා කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

1. දැදිගම මලන්දෙණිය අඹලෙන පිවිසුම් මාර්ගයට හා පඩිපෙළ සංවර්ධනය කිරීම.
2. බුරුන්තාව අඹගහමුල පාර පැති බැම්ම ඉදි කිරීම.
3. බුරුන්තාව කුරුපවටිය මාවත සංවර්ධනය කිරීම.

ii පරීක්ෂා කරන ලද ලිපිගොනු අනුව කර්මාන්තයට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අදාළ වැඩ බිමට ලැබුණු බවත් එකී ද්‍රව්‍ය මිණුම් ගැනීමට හැකිවන පරිදි ගොනුකර, පරීක්ෂා කර, සහතික කල බවට තොරතුරු අනාවරණය නොවුණි.

iii ව්‍යාපෘති (කර්මාන්ත) ඇස්තමේන්තු සැකසීමේදී ඒ සඳහා භාවිතාකරන ගාස්තු උප ලේඛනයේ යොමුව දැක්විය යුතු වුවද, ප්‍රදේශීය සභාව විසින් සකස් කරන ලද ඇස්තමේන්තු හා ගෙවීම් සඳහා උපයෝගී කර ගන්නා මිණුම් සටහන් වල එකී ගාස්තු උපලේඛන යොමුව දක්වා නොතිබුණු අතර අදාළ ඉදිකිරීම් ගාස්තු වලට අමතරව ප්‍රවාහන වියදම් සඳහාද සැලකිය යුතු වටිනාකමක් ඇතුළත් කර ඇති බවද නිරීක්ෂණය විය. ප්‍රවාහන වියදම් ඇතුළත් කල අවස්ථා කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

ව්‍යාපෘතිය	මුළු	වැඩ	ප්‍රවාහන	මුළු වියදමෙන් ප්‍රතිශතය
	වටිනාකම	වියදම	වියදම	
-----	රු.	රු.		%
1. දැදිගම මලන්දෙණිය අඹලෙන පිවිසුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.	1,710,657	32,771		1.91
2. බුරුන්තාව කුරුපවටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.	489,655	6,155		1.25
4. බුරුන්තාව කුරුපවටිය මාවතේ දුෂ්කර ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම.	286,283	9,886		3.45
5. ඉහළ ලෙනගල කොබ්බෑවල හරහා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.	970,924	34,118		3.51

6. බුරුන්තාව ගම්මැදි මාර්ගය සංවර්ධනය	388,000	12,924	3.33
7. උඩුකුඹුර හම්බන්තොට මාර්ගයේ ආරම්භක ස්ථානයේ රැඳවුම් බැම්ම ඉදිකිරීම.	456,386	7,634	1.67
8. බුරුන්තාව අඹගහමුල පාර පැන බැම්ම ඉදිකිරීම.	415,392	7,925	1.91

iv. එකම ගොඩනැගිල්ල හෝ එකම මාර්ගය සංවර්ධනය සඳහා ආයතන කිහිපයක් හෝ එකම ආයතනයෙන් ප්‍රතිපාදන ලබාගෙන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ලෙස ඉටුකර ගැනීම නිසා වෙනත් අවශ්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති (අනෙකුත් ප්‍රදේශ වලට) ඉටුකර ගැනීමට ඇති අවස්ථා අහිමිවීමේ හැකියාවක් ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. විස්තර පහත දැක්වේ.

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	අනුඥාන අංකය (ගොනු අංකය)	ප්‍රතිපාදන ලබාදෙන ආයතනය/ වැඩසටහන	ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.
20	වද්දෙණිය සංගිලි පාලම අළුත්වැඩියා කිරීම	LGR-2413903	ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය	1,000,000
07	වද්දෙණිය සංගිලි පාලම අළුත්වැඩියා කිරීම	ව.ප්‍රා.ස.සං.31 දී.වි.සං.07	දිස්ත්‍රික් විශේෂ සංවර්ධන වැඩසටහන	485,000
45	හසන්පුර අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	LGR(53)-2413908	ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය	500,000

37	හසන්පුර අතුරු දඳුමු බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම	LGR-2413904	ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය	1,000,000
60	ගණිතපුර හසන්පුර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	LGR(53)-2413902	ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය	400,000
57	ඉහළවෙල පළමු පටුමග සංවර්ධනය කිරීම	LGR(53)-2413904	ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය	500,000
63	ඉහළවෙල පළමු පටුමග සංවර්ධනය කිරීම	LGR(53)-2413925	ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය	500,000
01	ඉහළ ලෙනගල ඓතිහාසික ලෙනකඩුව විහාරස්ථානයේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ව.ප්‍රා.ස.සං.31 සං.වැ.01/2024	සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය	1,475,629
27	ඉහළ ලෙනගල ලෙනකඩුව, රජමහා විහාරස්ථානය අසලින් මාර්ගයේ ආරක්ෂිත පැති ඉදිකිරීම	ව.ප්‍රා.ස.සං.31 කඳු,දග. 27/2024	කළුකර දඟකය වැඩසටහන	970,714
05	කැටගොඩේවත්ත අංගනය ඉදිකිරීම	කොම්පෝස්ට් SWS/2413901	ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය	2,600,000
	සෂ් අපද්‍රව්‍ය එකතු මධ්‍යස්ථානය දෙවන කර ගැනීම.	කිරීමේ ස්ථාපිත 4 ව.ප්‍රා.ස.	NSW/SG/SW M/2024/NP/0	3,091,213

03. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති (කර්මාන්ත) භෞතික පරීක්ෂාව

ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති (කර්මාන්ත) වලින් නියැදියක් ලෙස තෝරාගත් ව්‍යාපෘති 09 ක් 2025 ජනවාරි 23 හා 24 දිනවල භෞතිකව පරීක්ෂා කිරීමේදී පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.

3.1 ඉහල ලෙනගල ඓතිහාසික ලෙනකඩුව විහාරස්ථානයේ පිවිසුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉටු කිරීම සඳහා වැඩ විෂයයන් 15 ක් ඇතුළත් කර රු.1,475,629.72 ඇස්තමේන්තුවක් සකස්කර මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව (රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛ අංක 01/2021 දරන 2021.09.29 දිනැති වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව) පනාන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට මාස 02 ක් ඇතුළත කර්මාන්තය ඉටු කිරීම සඳහා 2024 ඔක්තෝබර් මස 24 දින ගිවිසුම් ගතව එකී සමිතියට 2024 දෙසැම්බර් 24 දිනැතිව රු.1,175,679.24 ක මුදලක් ගෙවීම සඳහා කටයුතු සලසා තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් කෙරේ.

(අ) නිසි ශක්‍යතා අධ්‍යයනයකින් තොරව ඇස්තමේන්තු සැකසීම නිසා ඇස්තමේන්තුවේ සඳහන් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩ අවසන් වාර්තාවේ ප්‍රමාණ අඩු බැවින් අධි ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

වැඩ විෂය අංකය	වැඩ විස්තරය	ඇස්තමේන්තු ගත ප්‍රමාණය		තත්‍ය ප්‍රමාණය		වෙනස	වෙනසේ වටිනාකම
		වර්ග මීටර / සෂ මීටර	මීටර	වර්ග මීටර / සෂ මීටර	මීටර		
03	මි.මී.25 සෂකම සහිතව කොන්ක්‍රීට් යෙදීම සඳහා සැටලිං ගැසීම	32.40		14.22		18.18	40,195

04	1:3:6 මිශ්‍රණය 20% කොන්ක්‍රීට් යෙදීම	07.02	04.67	2.35	50,887
07	පස් යෙදීම	07.20	0.40	6.8	10,200
08	කොන්ක්‍රීට් මට්ටම් කිරීම හා සුමට කිරීම	212.50	170.02	42.48	5,832
09	පොලිතින් ඇතිරීම	212.50	169.57	42.93	3,636
11	මි.මි. 25 කොන්ක්‍රීට් යෙදීම	31.88	26.26	5.62	173,001

(ආ) මෙම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු සැකසීමේදී මාර්ග අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන අදාළ ස්ථානවල බෝක්කු, පැති බැම්, ආරක්ෂිත ගල් හෝ ආරක්ෂිත වැටවල්, කානු පද්ධති හා උරහිස් පිළිබඳ සැලකිලිමත් නොවීම නිසා මෙම මාර්ගය භාවිතා කරන්නන්ට මෙන්ම මාර්ගයටද අනාරක්ෂිත තත්ත්වයක් ඇති බවද නිරීක්ෂණය විය. විස්තර ඡායාරූප 01 හි දැක්වේ.



(ඇ) වැඩ විෂය අංක 11 ට අනුව 1:3:4 (මි.මි.19) කොන්ක්‍රීට් යෙදීම මි.මි. 150 උස කොන්ක්‍රීට් යොදා ඇති බව දක්වා තිබුණද භෞතික පරීක්ෂාවේදී හියුම්බට යොදා ඇති ස්ථානවල උස මි.මි.25-35 ක් පමණ වන බවත් නිරීක්ෂණය වූයෙන් මාර්ගයේ හියුම් තාප්පය හා කොන්ක්‍රීට් ඉතා ඉක්මනින් කැඩීයාමේ අවදානමක් පවතින බවත් කොන්ක්‍රීට් තවදුරටත් අවශ්‍ය සහකමට යොදා නොමැති බවත් නිරීක්ෂණය විය. විස්තර ඡායාරූප 02 ට දැක්වේ.



3.2 බුරුන්තාව අඹගහමුල පාර පැති බැම්ම ඉදිකිරීම

මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉටුකිරීම සඳහා වැඩ විෂයන් 10 ක් ඇතුළත් කර ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කර මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව 2021.09.29 දිනැති අංක 01/2021 දරන මුදල් වකුලේඛය ප්‍රකාරව බුරුන්තාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට මාස 02 ක් ඇතුළත කර්මාන්ත ඉටුකිරීම සඳහා 2024 ජූලි 15 දින ගිවිසුම් ගතව, එකී සමිතියට 2024.09.05 දිනැතිව රු.415,392 මුදලක් ගෙවීම් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසා තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් විය.

(අ) පැති බැම්ම මෙම මාර්ගයේ කෙළවර ඉදිකර තිබුණු අතර, මාර්ගයේ මුල් කොටස මාර්ග සංවර්ධන අවශ්‍යතා රැසක් පැවතී අතර ඇතැම් ස්ථානවල වාහන ධාවනය කිරීමට ද අසීරු තත්ත්වයක පැවතුණි.

(ආ) මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තු සැකසීම නිසි පරිදි ගණනය අධ්‍යයනයක් සිදු නොකොට කටයුතු කිරීම නිසා ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රමාණය හා ඉටුකළ ප්‍රමාණය අතර සැලකිය යුතු තරම් වෙනස්කම් (විචලනයන්) නිරීක්ෂණය විය. විස්තර පහත දැක්වේ.

වැඩ විෂයය අංකය	වැඩ විස්තරය	ඇස්තමේන්තු ප්‍රමාණය	තත්‍ය ප්‍රමාණය	වෙනස	වෙනසෙහි වටිනාකම
-----	-----	-----	-----	-----	-----
		වර්ග මීටර් / සැණ මීටර්	වර්ග මීටර් / සැණ මීටර්	වර්ග මීටර් / සැණ මීටර්	රු.
04	ඩවල් ගැසීම	04	-	04	5,930
05	1:2:4 මිශ්‍රණයෙන් කොන්ක්‍රීට් යෙදීම	1.89	2.48	0.59	16,777
06	සැටලින් ගැසීම	56.70	41.12	15.58	34,432
07	1:3:6 මිශ්‍රණයෙන් කොන්ක්‍රීට් යෙදීම	11.34	9.26	2.08	45,040
08	Weep hikd (pvc 100m)	6.30	2.70	3.6	6,342
09	පස් පිරවීම	6.30	8.58	2.28	3,420

(ඇ) මෙම පැති බැම්ම මාර්ගයේ ආරක්ෂාවට යොදන බව දක්වා තිබුණද භෞතික පරීක්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය වූයේ මාර්ගයට යාබද ඉඩම් හිමිකරුගේ ඉඩම් මායිම්වල ආරක්ෂාව සඳහා වැට සකස් කිරීමට යොදාගත් බැම්මක් බවයි. මෙම වැට නිසා මාර්ගයේ වාහන ගමන් කිරීමටද ඉතා අසීරු බවක් නිරීක්ෂණය විය. විස්තර ඡායාරූප 03 හි දැක්වේ.



3.3 දැඳිගම බහු කාර්ය සේවා මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම

මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉටුකිරීම සඳහා වැඩ විෂයන් 13 ක් ඇතුළත් කර රු.1,659,959 ක ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කර මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව (2021.09.29 දිනැති අංක 01/2021 දරන රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව) ජයලත්කන්ද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය සමඟ මාස 01 සති 02 කින් වැඩ ඉටුකිරීම සඳහා ගිවිසුම් ගතව තිබුණ අතර 2024.08.29 දිනැතිව රු.1,659,959 ක මුදලක් ගෙවීම් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසා දී තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.


(අ) මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ අත්තිවාරම් මට්ටමට ගොඩනගා ඇති ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ විෂය අංක 06 අනුව දිග මීටර් 09 ක් වූ මි.මි. 225 x 225 ප්‍රමාණයේ තලාද 03 ක් (බිම්) හා දිග මීටර් 6.4 ක් වූ හා 225 x 225 ප්‍රමාණයේ තලාද 04 ක් සඳහා සෑම මීටර් 2.6 ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණද, ගෙවීම් වාර්තාව අනුව මීටර් 10.9 ක් දිගැති තලාද 03 ක් සහ මීටර් 8.4 දිගැති තලාද 04 ක් යොදා තිබූ බැවින් සෑම මීටර්

3.35 ක් සඳහා රු.114,580 ක් ගෙවීම නිසා සඳහා මිල 0.69 ක් වෙනුවෙන් රු.23,600 ක් ඇස්තමේන්තුව ඉක්මවා ගොවා තිබුණි.

(ආ) වැඩ විෂයය අංක 07 අනුව මිල 9.6 x 8.6 x 0.120 ප්‍රමාණයට කොන්ක්‍රීට් කටුවක් ඉදිකිරීමට ඇස්තමේන්තු කර තිබුණද ගෙවීම් වාර්තා අනුව 10.9 x 8.4 x 0.12 ප්‍රමාණයට සඳහා මිල 10.98 ක් සඳහා ගෙවීම් කර තිබූ බැවින් ඇස්තමේන්තු ප්‍රමාණය ඉක්මවා සඳහා මිල 1.07 ක් සඳහා රු.36,627 ක් ගොවා තිබුණි.

(ඇ) මුළු ගොඩනැගිල්ල ඉදිකර අවසන් කිරීමට හැකි පරිදි ප්‍රතිපාදන වෙන් නොකිරීම නිසා ඉතිරි වැඩ කොටස් ඉටු කිරීමකින් තොරව අතර මග නවතා දමා තිබුණු බැවින්, මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලැබී නොතිබුණු අතර 2024 වර්ෂයේ දරන ලද රු.1,659,959 ක් 2022 වර්ෂයේදී දරන ලද රු.550,748 ක් වශයෙන් එකතුව රු.2,210,707 ක වියදම නිශ්ක්‍රීය වියදමක් බවට පත්ව තිබුණි.

(ඈ) තවද විගණන දිනය වූ 2025 ජනවාරි 23 වන විට කොන්ක්‍රීට් කටුව වැසි ජලය හා හිරු එළියට නිරාවරණය වීමත් කොන්ක්‍රීට් කටුව හා එයින් ඉහල මහලය ඉදිකිරීම සඳහා මතුකර (පන්තා) ඇති කම්බි දිරාපත් වෙමින් පවතින බවද නිරීක්ෂණය විය. විස්තර ඡායාරූප 04 හි දැක්වේ.

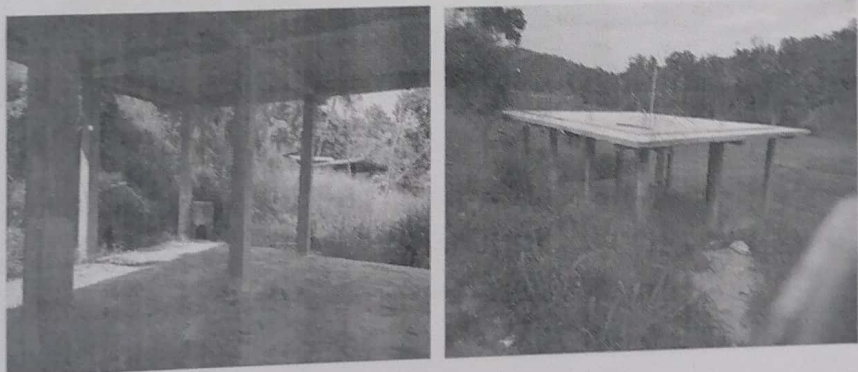

3.4 දැදිගම මලන්දෙනිය අඹලෙන පිවිසුම් මාර්ගය හා පඩිපෙළ සංවර්ධනය කිරීම

මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉටු කිරීම සඳහා වැඩ විෂයන් 13 ක් ඇතුළත් කර ඇස්තමේන්තුවක් සකස්කර මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව (රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛ අංක 01/2021 හා 2021 සැප්තැම්බර් 29 දිනැති චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව) පිටදෙනිය ගොවි සංවිධානය සමඟ දින

15 ක් ඇතුළත කර්මාන්තය නිමකිරීම සඳහා 2024 දෙසැම්බර් 06 දින ගිවිසුම් ගතව තිබුණි. 2024 දෙසැම්බර් 24 දිනැතිව මෙම කර්මාන්තය සඳහා රු.1,710,657 ක මුදලක් ගෙවීම් සඳහා කටයුතු සලසා දී තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් කෙරේ.

(අ) මෙම මාර්ගයේ ආරම්භක ස්ථානයන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉටු කළ ස්ථානයන් අතර වාහන ගමන් කිරීමටද ඉතා අපහසු ස්ථානයන් තිබූ අතර එම කොටස් ඉටු කිරීමකින් තොරව මාර්ගය අවසානයේ වූ කොටස ඉටුකර තිබුණි. විස්තර ඡායාරූප 05 හි දැක්වේ.



(ආ) මෙම අඹලෙන මිනිස් වාසයෙන් තොරව වූ අතර වල් බිහි වී ඇති බැවින් මෙම ස්ථානයට සංචාරකයන් නොපැමිණෙන බවත් නිරීක්ෂණය වූ අතර ඉදිකරන ලද මාර්ගය එම ස්ථානයට මදක් ඇතින් වූ පෞද්ගලික ඉඩම් හිමියකුට අයත් ඵලදාව ලබා ගන්නා (රබර්) ඉඩමක් දක්වා සකස්කර එතැනින් පිවිසුම් මාර්ගය නවතා තිබුණි. පඩිපෙළ ඉදිකරන ලද හා කොන්ක්‍රීට් කරන ලද මාර්ගය සහිත ඉඩම වතු හිමියාගේ ඉඩම් වන අතර එම ඉඩම් කොටස් සභාවට පවරා ගැනීම් කර නොතිබුණි. විස්තර ඡායාරූප 06 හි දැක්වේ.



(ඇ) නිසි ශක්‍යතා අධ්‍යයනයකින් තොරව ඇස්තමේන්තු පිළියෙළ කිරීම නිසා ඉදිරිපත් කරන ලද ඇස්තමේන්තුව හා මිනුම් වාර්තා අතර සැලකිය යුතු වෙනස්කම් තිබුණි. විස්තර පහත දැක්වේ.


වැඩ විෂයය	ඇස්තමේන්තු	තත්‍ය ප්‍රමාණය	වෙනස	වෙනසෙහි	
අංකය	විස්තරය	ප්‍රමාණය		වටිනාකම	
-----	-----	-----	-----	-----	
		වර්ග මීටර් / සැණ මීටර්	වර්ග මීටර් / සැණ මීටර්	වර්ග මීටර් / සැණ මීටර්	රු.
09	1:2:4(19) ප්‍රමාණයේ කොන්ක්‍රීට් දැමීම	16.32	8.94	7.38	216,477
10	සැටලින් ගැසීම	27.20	20.84	6.36	<u>14,061</u>
					<u>230,538</u>

මේ අනුව වැඩ විෂයයන් 02 ක එකතුව රු.230,538 න් සඳහා අධි ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කර ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ.

3.5 කැටගොඩ වත්ත කොමිපෝස්ට් අංගනය ඉතිරි වැඩ සහ සහ අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ දෙවන අදියර ස්ථාපිත කර ගැනීම.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉටුකිරීම සඳහා වැඩ විෂයන් 10 ක් ඇතුළත් කර රු.2,600,000 ක ඇස්තමේන්තුවක් සහ වැඩ විෂයන් 16 ක් ඇතුළත් රු.3,091,213 ක ඇස්තමේන්තුවක් වශයෙන් අරමුදල් ප්‍රභවයන් 02 කින් එකතුව රු.5,691,213 ක ප්‍රතිපාදන සලසාගෙන වෙන්කර පිළිවෙලින් අඹේපුස්ස ගොවි සංවිධානය හා අඹේපුස්ස වැඩිහිටි සමිතිය සමඟ සභාව ගිවිසුම් ගතව තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් කෙරේ.

(අ) මෙම කර්මාන්ත 02 න් කොන්ක්‍රීට් කුළුණු 06 ක් හා කුළුණු 04 ක් වශයෙන් කුළුණු 10 ක් ඉදිකර ඒ මත යකඩ බාල්ක දමා වහලය සවිකර තිබුණු අතර තවදුරටත් වහලය දික් කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි යකඩ බාර් පන්තා තිබුණි. මෙම යකඩ කොටස් වැස්සට හා හිරු එළියට නිරාවරණය වෙමින් පවතින නිසා දිරායාමට හැකියාව පවතින බවද නිරීක්ෂණය විය. විස්තර ඡායාරූප 07 හි දැක්වේ.

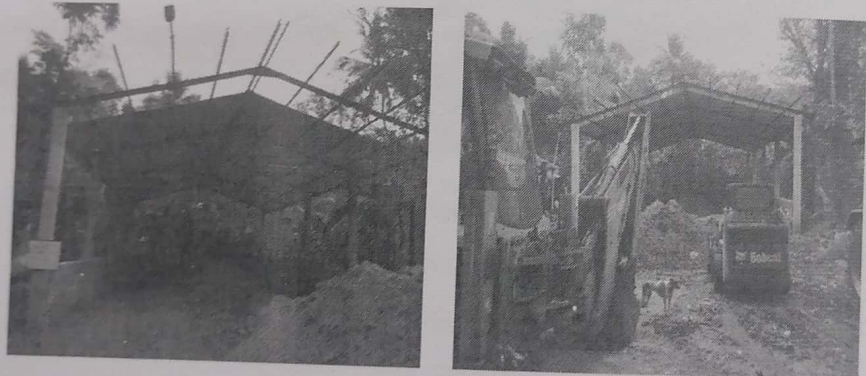

(ආ) නිසි ශක්‍යතා අධ්‍යයනයකින් තොරව ඇස්තමේන්තු සැකසීම නිසා ඇස්තමේන්තු ප්‍රමාණය හා තත්‍ය ප්‍රමාණය අතර සැලකිය යුතු වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය විය. මේ අනුව ඇස්තමේන්තු කරන ලද ඇතැම් වැඩ කොටස් ඉටුකර නොතිබුණු අතර ඇතැම් වැඩ කොටස් ඇස්තමේන්තු ප්‍රමාණය ඉක්මවා ඉටුකර ගෙවීම් කර තිබුණි. විස්තර පහත දැක්වේ.

i. කැටගොඩේ වත්ත කොම්පොස්ට් අංගනය ඉතිරි වැඩ

වැඩ විෂයය අංකය	වැඩ විෂයය විස්තරය	මිණුම් ඒකකය	ඇස්තමේන්තු ප්‍රමාණය	තත්ව ප්‍රමාණය	වෙනස	වෙනසේ වටිනාකම රු.
01	1:2:4(3/4) කොන්ක්‍රීට් කුළුණු (COLOUMS) ඉදිකිරීම	Cube	0.78	0.72	0.06	5,532
02	1:2:4(3/4) කොන්ක්‍රීට් තලාද (BEAMS) ඉදිකිරීම	Cube	0.66	-	0.66	67,282
03	එම තලාද සඳහා සැටලින් ගැසීම	Sqft	100	-	100	20,868
04	කුළුණු සඳහා සැටලින් ගැසීම	Sqft	156	288	132	46,464
05	යකඩ කම්බි	Kg	221	107	114	63,675
10	STIFFINER සපයා සවි කිරීම	Nos	03	-	03	8,550

මේ අනුව වැඩ විෂයයන් 03 ක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉටුකර නොතිබුණි.

i. සහ අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ දෙවන අදියර ස්ථාපිත කර ගැනීම

වැඩ විෂයය අංකය	වැඩ විෂයය විස්තරය	මිණුම් ඒකකය	ඇස්තමේන්තු ප්‍රමාණය	තත්ව ප්‍රමාණය	වෙනස	වෙනසේ වටිනාකම රු.
a-2	ABC සපයා තැලීම	Cube	5.44	11.20	5.76	119,232
b-1	1:3:6 (3/4) මිශ්‍රණයෙන් කොන්ක්‍රීට් දැමීම	Cube	0.34	0.23	0.11	9,552
b-2	1:2:4 (3/4) මිශ්‍රණයෙන් බිම් මහලේ තලාද කොන්ක්‍රීට් දැමීම	Cube	0.68	1.88	1.20	116,153
b-3	1:2:4 (3/4) මිශ්‍රණයෙන් බිම් මහල කුළුණු කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Cube	0.36	0.24	0.12	11,065
b-4	1:2:4 (3/4) මිශ්‍රණයෙන් පළමු මහල තලාද කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Cube	0.52	0.74	0.22	22,437
b-5	1:2:4 (3/4) මිශ්‍රණයෙන් පළමු මහල කුළුණු කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Cube	1.66	0.49	1.17	107,883
b-7	කුළුණු සඳහා සැටලින් ගැසීම	Sqft	352	222	130	45,760
c-1	සවි ගැන්වීම (කම්බි බැඳීම)	Kg	403	506	103	57,532

(ඇ) මෙම කර්මාන්තය නිම කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිපාදන සලසා ගෙන කර්මාන්තය නිම කිරීම වෙනුවට ප්‍රතිපාදන කොටස් වශයෙන් සලසාගෙන ගොඩනැගිල්ලේ කොටසක් පමණක් ඉදිකර තිබීම නිසා 2024 වර්ෂයේදී දරන ලද එකතුව රු.5,691,213 ක වියදම නිශ්ක්‍රීය වියදමක් බවට පත්ව තිබුණි.

ඉහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව ඔබගේ අදහස් විමසුමේ දින සිට සති 02 ක කාලයක් තුළ ලබාදීමට කටයුතු කරන්නේ නම් කෘතඥ වෙමි.

පිළිතුරු ජවීය යුතු ලිපිනය

විගණන අධිකාරී,

විගණන උප කාර්යාලය,

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,කෑගල්ල.

Danarathna

එස්.එම්.එස්.කේ. සමරකෝන්,

එස්. එම්. එස්. කේ. සමරකෝන්
විගණන අධිකාරී
විගණන කාර්යාලය
කෑගල්ල.

විගණන අධිකාරී,

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති වෙනුවට

- පිටපත :-
1. පළාත් පාලන කොමසාරිස්, සබරගමුව පළාත් සභාව, රත්නපුර.
 2. පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස්, කෑගල්ල.

වැඩසටහන	ව්‍යාපෘතිය	වටිනාකම
-----	-----	-----
		රු.
විශේෂ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති	i. පැරණි කාර්යාල භූමියේ සාප්පු සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම	50,000,000
	ii. කැටගොඩ වත්ත සහ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ඒකකයේ නව කසළ අංගනය ඉදිකිරීම	620,000
පොදු පරිපාලනය	i. කාර්යාලය ඉදිරිපිට වැට සකස් කිරීම හා ශේච්චුවක් සකස් කිරීම	2,500,000
	ii. වාහන නඩත්තු ඒකකයක් සැකසීම	200,000
	iii. සභාගර්භයේ ශබ්ද විකාශන පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම	50,000
	iv. සභාගර්භය නවීකරණය කිරීම	400,000
සෞඛ්‍ය සේවා	i. කසළ ප්‍රතිවක්‍රීකරණ කොමිෂන්ස්ට් ව්‍යාපෘතිය	950,000
	ii. තෙලි ඇල්ල කසළ වැඩබිම නඩත්තුව හා ඒ ආශ්‍රිත වන වගාව	50,000
	iii. අල්ගම නගරයට පොදු වැසිකිලියක් ඉදි කිරීම	1,200,000
භෞතික සැලසුම්	i. මංමාවත් ගොඩනැගිලි හා කානු පද්ධති සංවර්ධනය	20,000,000
	ii. රථ වාහන නැවතුම් පලක් සකස් කිරීම	800,000
	iii. ක්‍රීඩා පිටි සැකසීම	400,000
	iv. මාර්ග හා ගොඩනැගිලි නඩත්තු ඒකකයන් සකස් කිරීම	100,000
	v. මාහේන ජල යෝජනා ක්‍රමයට මුරකුටියක් සැකසීම	800,000
වෙනත් උපයෝගී සේවා	i. පොදු ලිං ඉදි කිරීම	500,000
	ii. සතිපොල සංවර්ධනය	1,000,000
	iii. පැරණි කාර්යාල භූමියේ සාප්පු සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම	8,000,000
	iv. වරකාපොල හෙළ බොජුන්හල සඳහා ලිඳක් සකස් කිරීම	800,000
සුභ සාධන සේවා	i. පුස්තකාල ජාල ගත කිරීම	600,000
	ii. සතිපොල භූමිය අසල ළමා උද්‍යානය හා ඇවිදින මංකීරුව නඩත්තුව	500,000
	iii. සභාව සතු ප්‍රජාශාලාව නවීකරණය	200,000
	iv. වාරියගොඩ පුස්තකාලය ඉදිකිරීමේ මූල්‍ය කටයුතු	100,000
	v. නගරශාලාවේ ඉතිරි වැඩ	58,000,000
		<u>147,770,000</u>

